Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Planung**	**40 Tage?**	**Mo 06.01.03**	**Fr 28.02.03**
2	Abschluß Entwurfsplanun	16 Tage?	Mo 06.01.03	Mo 27.01.03
3	Vorlage Entwurfsplanung	1 Tag?	Do 23.01.03	Do 23.01.03
4	Ausführungsplanung	27 Tage?	Do 23.01.03	Fr 28.02.03
5	LV`s / Ausschreibungsun	13 Tage?	Do 06.02.03	Mo 24.02.03
6	Bestätigung der Planung	0 Tage	Mi 26.02.03	Mi 26.02.03
7	Änderungen einarbeiten	2 Tage?	Do 27.02.03	Fr 28.02.03
8	**Ausschreibung**	**41 Tage?**	**Do 13.02.03**	**Do 10.04.03**
9	Anzeige Ausschreibung	12 Tage?	Do 13.02.03	Fr 28.02.03
10	Unterlagen Versenden	8 Tage?	Mo 03.03.03	Mi 12.03.03
11	Abgabe / Submission	17 Tage?	Di 04.03.03	Mi 26.03.03
12	Submission	0 Tage	Mi 26.03.03	Mi 26.03.03
13	Auswertung	6 Tage?	Fr 28.03.03	Fr 04.04.03
14	Zuschlagsfrist	4 Tage	Mo 07.04.03	Do 10.04.03
15	**Ausführung**	**27 Tage?**	**Fr 11.04.03**	**Fr 16.05.03**
16	Verträge	3 Tage?	Fr 11.04.03	Di 15.04.03
17	Materialbestellung Tischle	7 Tage?	Fr 11.04.03	Mo 21.04.03
18	Ausführung Tischler	16 Tage?	Mo 21.04.03	Fr 09.05.03
19	Montage Grafikpaneel	3 Tage?	Mi 07.05.03	Fr 09.05.03
20	Möbelbestellung	24 Tage?	Fr 11.04.03	Di 13.05.03
21	Möbellieferung	2 Tage?	Di 13.05.03	Mi 14.05.03
22	Endreinigung	2 Tage?	Do 15.05.03	Fr 16.05.03
23	Übergabe	0 Tage	Fr 16.05.03	Fr 16.05.03
24	**Eröffnung**	0 Tage?	Sa 17.05.03	Sa 17.05.03

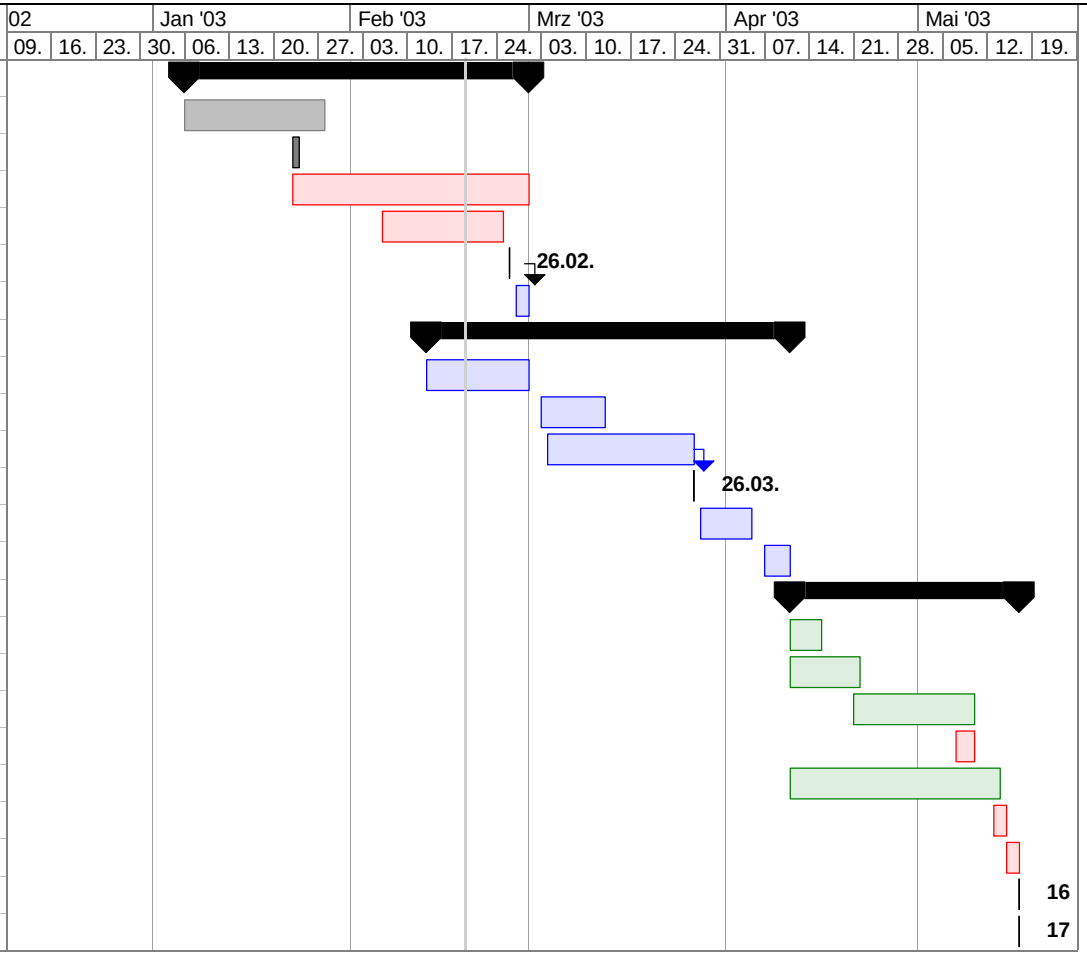

Projekt: Museum
Datum:

Vorgang	Rollup: Vorgang	Externe Vorgänge	
In Arbeit	Rollup: Meilenstein	Projektsammelvorgang	
Meilenstein	Rollup: In Arbeit	Gruppenkopf	
Sammelvorgang	Unterbrechung		
